

# DIE ABBUNDPROFIS

## Checkliste 1 Holzrahmenbau: **Wir sind Abbund.**

Kunde:


BV:

Datum:


### Traufdetail

Variante 1

mit Stellbrettnut  
rechtwinklig  
senklig  
Putzleiste bauseits !!

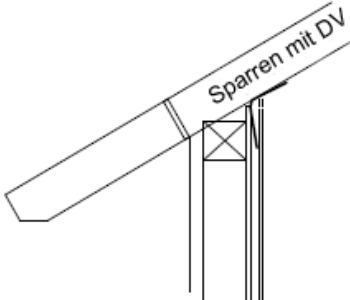


Variante 2

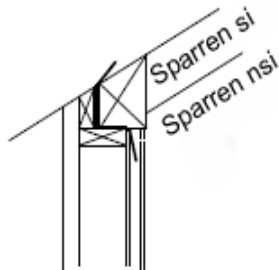

Anschluss SSV  
Ausnutzung AZB

Variante 3

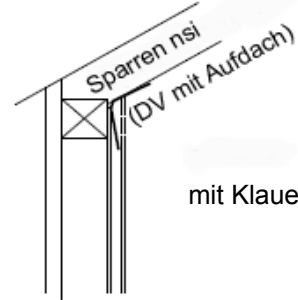


mit Klaue

### Deckenübergang

#### Deckenelement

Standard

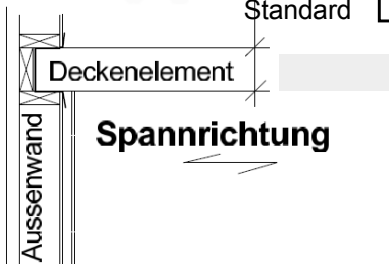

Spannrichtung



Quer zur Wand

Decke si


Decke nsi

Rampamuffen


Bearbeitungen an der Decke

=kleiner 62,5 u. Fremdfeder


doppel N&F  
oberseitige Abfalzung  
bauseitiges Einlagebrett




doppel N&F  
ohne oberseitige  
Abfalzung



einfach N&F  
oberseitige Abfalzung  
bauseitiges Einlagebrett



einfach N&F  
ohne oberseitige  
Abfalzung



#### si – Balkenlage sichtbar

Variante A



Anschluss SSV  
Ausnutzung AZB

Zwischenwand = Stellbrettnut  
Zwischenwand = Füllholz (breit)  
Zwischenwand wird bauseitig  
geschlossen

Variante B



Balkenlage si  
= Stellbrettnut

#### nsi – Balkenlage nicht sichtbar



Balkenaufleger



Balkenlage nsi  
Quer zur Wand

KVH

Bauholz A getr. m. Zumaß (+3mm)

Bauholz A getr. m. Zumaß (+3mm)

Bauholz S getr.+ geh. Mit Zumaß  
(+10mm)

BSH nsi

BSH si

DUO nsi

DUO si

FFB im DG

FFB im OG

FFB im EG

Zimmertüren 2,01m von FFB

Zimmertüren 2,135m von FFB

Schiebetür mit Tasche

(Angabe notwendig)

Schiebetür als Vorbau
